

Historien om nogle glade mennesker

(Det 18. Danske Akademi)



"Vi vil være det førende netværk for unge handlekraftige mennesker, der tager ansvar og gør en positiv forskel for sig selv og samfundet".

~1.000 medlemmer i DK

~200.000 på verdensplan

Historien om nogle glade mennesker


(Det 18. Danske Akademi)

- **Nyttemål**
 - Rugeplads for den nationale ledelse i løbet af de næste 1-3 år
 - Skabe grundlag for at næste års nationalpræsident kan sætte sit hold
- **Produktmål**
 - Afholde et fire dages intensivt internatkursus med fokus på personlig og ledelsesmæssig udvikling med et budget på 35.000 kr. samt en maksimal deltagerbetaling på 2.000 kr. inden den 20. august 2011 for JCI medlemmer med potentiale til at gøre en positiv forskel for sig selv og JCI i årene fremover


Jeg mener det var et projekt, fordi:

- Det var et klart defineret mål
- Det var tværorganisatorisk
- Det et hold for at få det til at ske
- Der var en tidsmæssig og en budgetmæssig begrænsning


For mig var det et type 2 projekt



Makro organiseringen var nem

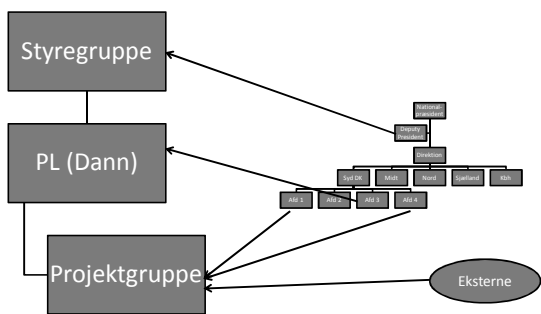


Projektets egen organisering var defineret af opgaverne (det kommer vi til)

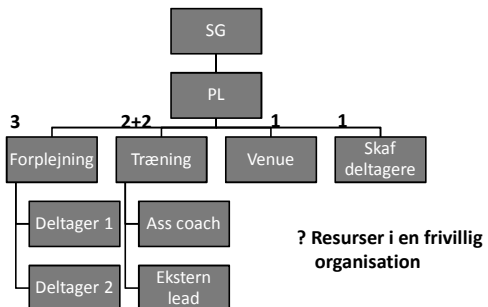

Hvem påvirker og påvirkes af projektet

(Metode 1 - koordinat)

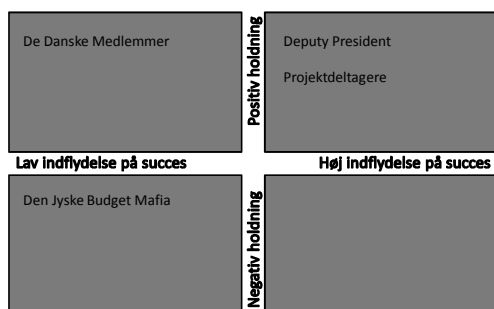


Cost/Benefit analysen er svær når det er non-profit

Effekt af nyttemål \$ >= Prisen for projektet

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Ikke muligt at kvantificere i kroner. Kan måles få måneder efter: er der et nationalt team for 2012 Kan måles mange år efter: var der en mindre medlemsafgang og var de mere aktive efterfølgende? | <ul style="list-style-type: none"> Foreningen bidrager med 35.000,- kr. Dertil den tid der investeres og eventuelle sponsorater (regnes ikke med her, men er naturligvis i selve budgettet) |
|--|---|

Klassisk fire faset model

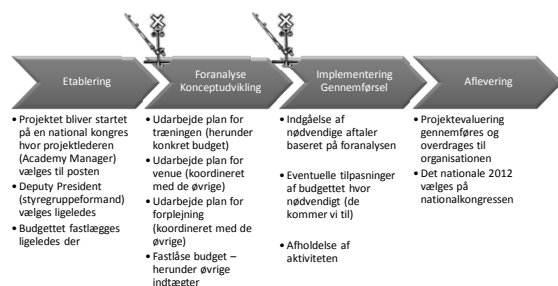

Projekttrekanten

Tid

- Deadline for projektet lå fast. Inden for de rammer var der fleksibilitet til hvornår det skulle afholdes

Kvalitet

- Intet klart kvalitetsmål, men høje forventninger

Resurser

- Tilskud fra foreningen lå fast
- Tid fra projektdeltagere er gratis og uendelig
- Uanede (uudnyttede) muligheder for andre indtægter
